

# 2007년도 상반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

## □ 확 인 개 요

- 기 간 : 2007. 4. 24 ~ 5. 4 (기간중 8일간)
- 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 63개소
- 확 인 반 : 1개반 7명
  - 반 장 : 심재국 의장
  - 반 원 : 유인환 부의장, 이만재 의원, 함명섭 의원, 김영해 의원,  
김진석 의원, 최귀녀 의원
  - 행정지원 : 전문위원, 의사담당, 김종은, 정태일, 지준상

## ○ 주요내용

- 수해복구공사 추진 및 준공실태
- 수해복구공사 현실여건 적합성 여부
- 미진 사업에 대한 이유 및 조기착공 독촉
- 정실시공 확인 및 지역주민여론 청취
- 지역주민 수해도 분석 및 사후관리 실태 점검
- 2006년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에 대한 집행기관 이행실태

## □ 확인 결과

### ○ 주요사업장 확인결과 지적 및 개선요구사항

구분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지적사항	개선요구 사항	확인 일자
계	63	63	19	25	8일
평창읍	7	7	1	5	4. 27
미탄면	5	5	4	1	5. 1
방림면	8	8	1	2	5. 2
대화면	12	12	4	2	4. 30
봉평면	5	5	2	4	5. 3
용평면	6	6	1	2	4. 26
진부면	12	12	2	6	4. 25
도암면	8	8	4	3	4. 24

## 지 적 사 항

### □ 횡계11리 경로당 신축공사(도암면)

- 도암면 횡계11리에서 추진되는 경로당 신축공사와 관련
  - 공사 추진의 지연으로 인하여 발생하는 여러 가지 문제점 해소차원에서 빠른 시일내에 공사가 완료될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하기 바람

### □ 회원농협 지원을 통한 농민 수혜 극대화 방안 강구(농정과)

- 군에서 회원농협을 대상으로 지원하는 각종 사업 예산과 관련
  - 관내 주민들의 소득증대를 위해 회원농협에 지원하는 사업비가 지역주민(농민)들에게 환원되는 혜택이 미미한 것으로 판단됨
  - 향후 예산 지원시에는 농협과의 협의를 통해 많은 주민들에게 수혜가 돌아가도록 하는 방안을 강구하기 바람

### □ 수해복구에 따른 토사(토석)채취 허가(산림과)

- 지난해 발생한 수해복구를 위해 관내 많은 곳에서 토사(토석)채취가 이루어지고 있는 것과 관련
  - 산림훼손 수허가자들은 채토, 채석, 절토에만 관심을 두고 복구에 대하여는 관심이 부족한 것으로 사료됨
  - 산림과 등 관련부서에서는 모든 허가지역이 장마철 이전에 완벽한 복구가 이루어질 수 있도록 조치하기 바람

## □ 문화마을 뒤편 산지전용허가(산림과)

### ○ 문화마을 뒤편 산지전용허가와 관련

- 건조기인 요즘 적은 강수량임에도 토사가 흘러내리고 있는 점 등을 감안하여 불 때 본격적인 우기철에는 수해피해의 주요원인으로 크게 작용할 것으로 예상되는 바, 철저한 행정지도를 통해 우기전 완벽한 산림복구가 이루어질 수 있도록 하기 바람

## □ 민원서류 처리의 일원화 체계 구축(민원봉사과)

### ○ 인·허가 민원서류 처리와 관련

- 주민들의 집단 반대에도 불구하고 허가 처리되는 민원이 있는가 하면, 불허 처리되는 민원도 있어 행정의 신뢰가 저하되고 있음
- 민원처리에 대한 명확한 기준 정립을 통해 모든 민원이 공정하게 처리될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 강민에너지 가스충전소 신축공사(지역도시과,산림과,기획감사실)

### ○ 하진부 2리 산202번지 가스충전소 신축으로 인해 발생한 집단 민원과 관련

- 산지 절개로 인한 사업부지내의 우수와 토사유출 및 축대붕괴 위험으로 인해 지역주민들이 민원을 제기하고 있는 바
- 관련부서에서는 사업장 부지내 석축에 대하여는 전문기관의 구조 안전진단이 실시 될 수 있도록 하고, 절토된 사업장에 대한 우수 및 토사유출 방지책을 마련하고 추진되도록 지도점검을 실시하기 바람

## □ 장평지구 관문정비사업(지역도시과)

- 우리군의 대표적인 관문인 장평이 평창군의 관문임을 알리기 위해 추진하는 관문정비사업과 관련
  - 그 동안 수 차례 장평관문정비사업의 중요성을 언급하고 우리군의 관문으로써 기능과 역할을 다할 수 있는 대책을 강구할 것을 요구하였으나 현재까지 용역비만 계상한 채 아무런 성과가 없는 것으로 확인되고 있음.
  - 관련부서에서는 관련기관과의 협의를 통해 조속한 시일내에 관문정비사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 흙탕물 저감 대책 강구(환경복지과, 건설과)

- 관내 주요하천이 수해복구공사 추진으로 인한 흙탕물 유입으로 인해 탁도가 높아지고 있는 것으로 확인되는 바
  - 사업추진부서에서는 철저한 지도감독의 실시로 흙탕물이 저감될 수 있도록 특단의 대책을 강구 하기 바람

## □ 평창초등학교 뒤 주택단지 조성공사(지역도시과)

- 평창초등학교 뒤 단독주택과 아파트 신축 공사와 관련 옹벽 및 석축 시공 등에 대한 안전사고 위험이 우려되고, 공사장 주변 관리소홀로 지역 주민들의 생활안전을 위협하고 있음
  - 관련부서에서는 옹벽 및 석축에 대한 구조안전진단 등을 통해 위험요인을 사전에 점검하고
  - 공사장 진·출입 차량으로 인해 발생하는 비산먼지의 억제시설이 설치될 수 있도록 지도감독을 실시하고,
  - 공사장 환경 정비를 통해 지역 주민들이 편안하게 생활을 영위할 수 있도록 하기 바람

## □ 건설자재 가격 지도단속 철회(기획감사실)

- 우리군에서 생산되고 있는 건설자재(전석,골재)와 관련
  - 산지 가격이 외지에서 반입되는 건설자재 가격보다 높아 지역 업체의 수해복구공사 추진에 많은 부담이 되고 있으며 이로 인해 수해복구공사의 부실시공으로 이어질 수 있는 만큼
  - 관련부서에서는 철회한 지도단속을 통해 시정될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 도시계획도로(중로 3-1호) 개설공사(지역도시과)

- 대화 삼양의원을 지나는 도시계획도로 개설공사와 관련
  - 공사구간내 지장물(삼양의원) 보상 협의 지난 등의 사유로 노선을 변경하여 우회하는 계획은 도시기반조성 및 도로개설 사업목적에 반하는 행정이라 사료되며, 원만한 사업추진을 위한 사업부서의 다각적인 검토 노력이 필요함

## □ 대화1리 소교량 수해복구 공사(대화면)

- 집중호우로 유실된 세월교를 철거하고 가교를 설치한 것과 관련
  - 가교의 난간이 미관을 저해하고 있어 대화면을 지나는 내방객들에게 대화면의 이미지를 실추시킬 것으로 판단되는 바 이에 대한 대책을 강구하기 바람

## □ 평창강(2급하천) 제3지구 수해복구공사(건설과)

- 상안미 선애교 위에서 추진중인 평창강 제3지구 수해복구공사와 관련
  - 수해를 입은 지역은 좌안임에도 우안을 정비하고 있어 수해 재피해가 예상되는 만큼 좌안에 대하여도 제방정비 사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람.

## □ 준도시 취락지구 사업(지역도시과)

- 미탄면 시가지 일원에서 추진중인 준도시 취락지구 사업과 관련
  - 지난해 하반기 현지 확인시 올해 추진하겠다고 약속을 하였으나 현재까지 예산조차 확보하지 않고 있어 주민들의 불만이 표출되고 있는 것을 감안 관련부서에서는 각별한 관심을 가지고 조속한 시일 내에 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

## □ 평창군 폐기물종합처리시설 설치공사(환경복지과)

- 미탄면 창리 도마치골에서 추진중인 폐기물종합처리시설 설치공사와 관련
  - 그간 주민들의 반대와 시공업체의 부도로 인해 사업이 계획보다 지연되었음을 감안 관련부서에서는 계획된 공기내에 완공될 수 있도록 각별한 관심을 가지고 사업을 추진하기 바람
  - 반대투쟁위원회 활동으로 인해 폐기물처리장 시설사업 추진이 지연되고 이로 인해 대화매립장을 대체부지로 활용함에 따라 발생한 손실비용과 소송비용 지출 등에 대하여는 손해배상청구 대책을 강구하기 바람
    - ※ 불특정다수의 주민들이 참여의도없이 한 행위는 제외하고, 직접적인 군비 손실부분에 대하여는 손실부분이 보전될 수 있도록 소송을 제기할 것

## □ 마하 생태주택관 조성사업(지역도시과)

- 많은 예산을 투자하여 조성된 마하 생태주택관 시설이 민물고기 생태관과의 연계 관리를 이유로 현재까지 활용되지 않고 있는 것과 관련
  - 오랜 방치와 시설관리 미흡으로 인해 건물에 누수가 발생되고, 우수처리시설이 지면보다 높아 건물로 우수가 유입되고 있는 등 발생한 문제점에 대한 보수공사를 실시하고, 관리책임자를 지정하여 철저한 관리를 기하도록 하기 바람

## □ 민물고기 생태관 건립사업(환경복지과)

○ 민물고기 생태관 건립사업의 추진이 지연되고 있는 주요 원인인  
암반 발생에 대한 것과 관련

- 설계업체가 설계시 지질조사 6공을 실시하였다고 하나 전반적인  
암반층 지역임에도 지질조사를 소홀히 하여 약 6억 5천만원의 추가  
사업비가 소요되고 공사가 지연되고 있는 등의 문제를 발생하게 한  
설계업체를 상대로 손해배상청구 등의 방안을 강구하기 바람

## □ 수해복구사업 참여업체의 부도에 따른 지역상인 보호대책 마련 (재무과, 사업부서)

○ 관내 토목사업 시공업체와 신용으로 거래하는 지역 상인들이 업체의  
부로도 인해 거래대금을 받지 못하는 사례가 발생함에 따라

- 계약 부서 및 사업주관부서에서는 시공업체의 동향을 면밀히 감시  
하고, 외지업체에 대하여는 준공처리시 지역 상가에 미수금이  
없는지 확인 후 사업비를 지출 등을 통해 지역 상인들이 피해를  
받지 않도록 대책을 강구하기 바람

## □ 덕거천 수해복구공사(건설과)

○ 봉평면 덕거리 일원에서 추진하는 덕거천 수해복구공사와 관련

- 수해복구공사시 덕거2리 잠수교는 철거 계획으로 있으나 이를  
재가설할 계획이 없음에 따라 이를 이용하는 지역주민들이 불만을  
호소하고 있는 바 잠수교 철거시 교량이 설치될 수 있도록 대책을  
강구하기 바람
- 김형남씨 집앞 ~ 잠수교까지의 하천선형은 문제가 있다고 확인된  
바 하천선형을 변경하여 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람



## 개 선 요 구 사 항

### □ 횡계 도시계획도로(소로 2-7, 3-8호) 개설공사(지역도시과)

○ 도암면 횡계리 일원에서 시행중인 도시계획도로(2-7, 3-8호) 개설  
공사와 관련

- 짧은 구간임에도 불구하고 지장물 보상 및 시설철거 후 방치로 인해 도시 미관을 저해하고, 올리브 프라자 옆 마을 진입로 폐쇄로 주민들이 통행불편을 겪고 있음에 따라
- 관련부서에서는 적극적인 의지를 가지고 사업을 추진될 수 있도록 대책을 강구 하기 바람
- 사업 우선순위는 지역주민의 애로사항이 있는 부분을 우선적으로 해결될 수 있도록 소로 3-8호 사업 완료 후 소로 2-7호가 아닌 소로 2-8호가 먼저 개설토록 추진하기 바람

### □ 군도 15호선 수해복구공사(건설과)

- 도암면 수하리 일원에서 추진중인 군도 15호선 수해복구공사와 관련
- 현재의 교통량은 도로개통 당시 교통량과는 비교할 수 없을 정도로 증가된 노선임을 감안 수해복구공사시 많은 곳에 노건이 확보될 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람

## □ 군도 12호선 수해복구공사(건설과)

- 군도 12호선 수해복구공사 추진과 관련 사업추진부서와 주민간의 의사소통 부족으로 인해 사업추진에 차질을 빚고 있는 것으로 확인되는 바
  - 도로에 편입되는 토지·건축주 및 지역 주민들을 대상으로 사업 설명회 개최 등을 통해 주민의 의사를 수렴하고 민원 해결책을 모색하여 조속한 시일내 사업이 완료될 수 있도록 하기 바람

## □ 농경지 수해복구 감독 철저(건설과)

- 농경지 수해복구 사업이 마을별 복구위원회를 중심으로 추진되면서 토사배급 및 복구비용 분배 등으로 인해 지급 주민간 갈등과 분쟁이 빈발하고, 정산 착오로 인한 선의의 피해를 입는 주민들이 발생할 것으로 예상되는 바
  - 담당부서에서는 이에 대한 사고를 미연에 방지할 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람
  - 농경지 수해복구를 마사토로 하고 있음에 따라 예상되는 마사토 유실로 인한 제2의 수해피해의 예방을 위해 경사지나 절개지 등을 대상으로 풀씨 파종 등의 실시로 토사유출 방지대책을 강구하기 바람

## □ 누락된 수해피해사업장에 대한 수해복구 전력 (건설과)

- 지난해 7월 사상 유래없는 수해로 인해 관내 많은 지역이 수해를 입은 것과 관련
  - 수해를 입은 지역임에도 피해 조사 당시 조사누락이나 사업비 삭감으로 인해 수해복구를 추진하지 못하는 곳이 상당수 있는 것으로 확인되는 바 중앙부처 및 강원도와의 긴밀한 협의를 통해 수해 피해를 입은 모든 사업이 추진될 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람

## □ 지역 건설업체 수해복구 참여방안 강구(재무과,건설과)

- 지난해 수해피해로 인해 관내에서 5천억원이 넘는 재정이 투자되어 수해복구 공사를 추진하고 있는 것과 관련
  - 수해피해발생 당시 군이하 행정기관에서는 지역업체를 상대로 응급복구를 지시하여, 모든 지역업체가 위험을 감수하고 수해피해가 최소화될 수 있도록 응급복구에 적극 참여하였으나, 수해복구 공사 입찰에서는 지역업체의 참여 기회가 배제되고 있는 실정임을 감안 지역 업체가 수해복구공사에 참여할 수 있는 방안을 강구하기 바람

## □ 송정1리 소하천 수해복구 공사(건설과)

- 송정1리 소하천 수해복구공사 추진과 관련
  - 설계서를 보면 하천의 하폭이 상류는 넓고 하류는 좁아지는 형태로 사업이 추진되고 있어 수해가 재발할 위험이 있다고 확인된 바 하류 지역 하폭을 확장하여 공사가 추진될 수 있도록 하기 바람

## □ 진부 도시계획도로 개설공사(지역도시과)

- 진부면 상진부리 혜청빌라 옆에서 추진하는 도시계획도로 개설공사와 관련
  - 우회도로와 마을내 도로가 연결되어 있지 않아 지역주민들이 통행 불편을 겪고 있음에 따라 우회도로와 마을내 도로가 연결될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 거문·상월오개 종합개선지구 수해복구공사(건설과)

- 거문리 거문초등학교 인근에서 추진하는 수해복구공사와 관련
  - 거문초등학교 옆 도수로가 수해복구계획에서 누락되어 있어 하절기 우수로 인해 농경지의 피해가 예상되는 만큼 거문·상월오개 종합개선지구 수해복구공사 추진시 도수로 공사 병행 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 도사리(고등골) 소하천 수해복구 공사(건설과)

- 강원도 발주로 추진중인 도사리(고등골) 수해복구사업과 관련
  - 하폭 확장으로 인해 기존의 교량은 철거되었으나 이에 대한 재가설 계획이 없어 주민들의 생활불편이 야기되고 있는 바 강원도와의 긴밀한 협의를 통해 수해복구로 철거된 교량이 재가설될 수 있도록 하기 바람

## □ 문화복지센터 건립사업(환경복지과)

- 평창군민들의 문화 욕구를 충족하기 위해 추진하고 있는 문화복지센터 건립과 관련
  - 본 사업은 도비 50%를 지원받아 추진하기로 계획되었으나, 추진 과정에서 도비 삭감으로 인해 군비 투자가 불가피한 것으로 확인된 바, 관련부서에서는 우리군의 어려운 재정형편을 감안 도비를 확보하여 사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 속사지구 집단이주마을 기반조성공사(지역도시과)

- 수해로 인해 보금자리를 잃고 집단 이주를 위해 추진하는 집단이주마을 기반조성과 관련
  - 집단이주 및 농가주택 신축을 위한 행정절차 대행 등의 적극적인 행정편의 제공으로 동절기 이전 모든 주민이 입주할 수 있도록 공사추진에 만전을 기하기 바람

## □ 입탄리 농어촌도로 포장공사(건설과)

- 도로의 교통량은 적으나 노면상태 불량으로 인해 이 도로를 이용하는 지역 주민과 내방객들이 통행불편을 겪고 있음에 따라
  - 관련부서에서는 조기 확·포장 될 수 있는 방안을 강구 바람

## □ 가로수 조성 사업(산림과,지역도시과)

- 관내 시가지에서 시가지 가로수 대부분을 은행나무로 조성하고 있는 것과 관련
  - 이 수종은 타 수종에 비하여 성장성이 뛰어나 전선을 건드리고 상가 간판의 시야를 저해하여 상인들이 불만을 호소하고 있는 바 향후 가로수 조성시에는 은행나무를 지양하고 우리군의 이미지 및 기후에 적절한 수종으로 조성하기 바람
  - 중앙분리대를 설치하는 도로에서는 사업추진상 가능하다면 이를 이용 가로화단 조성 방안을 검토하고
  - 평창읍 향동리 입구에 조성된 소나무가 솔잎혹파리로 인해 고사되고 있음에 따라 이에 대한 치료 및 대체수종으로 조성하는 방안 강구

## □ 주진~용항간 군도 확·포장 공사(건설과)

- 2006년부터 추진중인 주진~용항간 군도 확·포장공사와 관련
  - 주진리 마을회관 옆에서 주진교 구간의 도로 계획고의 상향조정으로 인해 지역 주민들이 주택의 피해를 우려하고 있음에 따라
  - 주택피해가 발생되지 않도록 공사 추진에 만전을 기하기 바람

## □ 평창하수종말처리장 시설공사(상하수도사업소)

- 평창읍 시가지의 하수처리를 위하여 추진중인 평창하수종말처리장 시설공사 추진과 관련
  - 향동리 청성애원 상류 지역과 후평리에는 많은 주민들이 거주하고 있음에도 하수처리구역에서 누락된 것은 부당하다고 확인된 바 누락지역이 하수처리구역에 편입될 수 있도록 각별한 관심을 기울여 사업을 추진하기 바람

## □ 하안미1리 소교량 수해복구 사업(건설과)

- 하안미 1리에서 대화8리 범구마을 진입도로 이용하는 세월교가 하천 정비계획에 의거 철거되고 하폭 확장으로 인해 하천부지내 가옥의 철거가 불가피한 것과 관련
  - 관련부서에서는 사업시행전 하천부지내 거주 주민들의 이주 등의 대책을 강구하기 바람

## □ 몽골유목문화관광체험장 조성공사(축산과)

- 대화면 하안미5리에 조성중인 몽골유목문화 관광체험장과 관련
  - 이 시설은 하안미 지역 주민 1,000여명이 식수로 이용하는 간이 상수도 상류에 위치하고 있어 우기철 마분과 관광객들의 생활오수로 인해 간이상수도가 크게 오염 될 수 있음을 감안 관련부서에서는 해당 사업장에 대한 철저한 지도·감독을 통해 간이상수도가 오염 되지 않도록 각별한 관심을 갖고 사업을 추진하기 바람

## □ 지역경기 활성화를 위한 팩키지 관광상품 개발(문화관광과)

- 동막골 영화세트장은 영화효과로 그간 많은 관광객들이 다녀갔으나 지역경기활성화에는 실질적인 영향을 주지 못하고 있는 것으로 확인 된 바
  - 백령동굴, 생태주택관, 래프팅, 양떼목장, 금당계곡, 월정사 등 우리 군 전역의 관광자원을 연계한 팩키지 관광상품을 개발하기 바람

## □ 공공시설물 관리비용 절감 대책 강구(재무과)

- 평창군의 신축하는 공공시설물과 관련
  - 평창군의 지방세는 지난 10년간 20여억원이 증가하였으나 공공 시설물은 기하급수적으로 신축되고 있어 앞으로 공공시설물 관리비 등의 고정비가 군의 재정에 부담을 안겨 줄 것으로 판단되는 바
  - 공공시설물에 대한 총체적 관리계획 수립을 통해 고정비용 절감 대책을 강구하기 바람

## □ 계촌마을하수도 시설공사(상하수도사업소)

- 계촌리 일원에서 추진중인 마을하수도 공사 추진과 관련
  - 중앙의 예산배정 지연으로 공사가 연기되고 이로 인해 이와 연계된 다른 공사의 시행도 지연되고 있는 것으로 확인되는 바 일률적인 사업추진은 지양하고 소액으로 단기간내 완료될 수 있는 공종에 대한 선 시공을 통해 주민불편 해소 대책을 강구하기 바람

## □ 봉평 중·고등학교 이전사업(재무과)

- 봉평 중·고등학교 이전사업이 강원도의 도시계획 심의과정에서 부결되어 지금까지 지연되었지만
  - 면민들의 숙원사업임을 감안 조속히 행정절차를 재개하여 사업이 조기추진 될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

## □ 친환경 제방공사 추진(건설과)

- 동일 하천 제방을 옹벽, 석축 등의 여러 가지 공법을 병행 시행함으로써 평창군의 청정청정하천의 미관을 저해하고 있음
  - 동일 하천에 대하여는 같은 공법을 이용 제방공사를 시행하기 바람, 주변경관과 조화를 이루는 친환경 제방공사가 추진될 수 있도록 각별한 관심을 갖고 사업을 추진하기 바람

## □ 평촌천 수해복구공사(건설과)

- 봉평면 평촌리 일원에서 추진하는 평촌천 수해복구공사와 관련
  - 수해복구비 부족으로 인해 사업 추진이 지연됨에 따라 우기시 재피해가 예상되는 바 조속한 시일내에 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

□ **봉평면 관문 직선화사업 적극적 검토(지역도시과)**

- 관광도시로서 발전하고 있는 봉평면 지역의 관문(창동리 한담모퉁이)이 큰 야산으로 인해 가로막혀 관광도시로서 기능을 떨어뜨리고 있는바,
  - 봉평면 시가지가 한눈에 보일 수 있도록 야산을 제거할 수 있는 방안을 검토하기 바람



-2007 상반기 군정주요사업장 현지확인-

## 지적사항 처리계획

### 1. 황계11리 경로당 신축공사(도암면)

#### □ 지적사항

- 도암면 황계11리에서 추진되는 경로당 신축공사와 관련
  - 공사 추진의 지연으로 인하여 발생하는 여러 가지 문제점 해소차원에서 빠른 시일내에 공사가 완료될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하기 바람

#### □ 처리계획

- 현재까지 추진상황 (공정율 30%)
  - 기초공사 완료, 벽체공사중
- 향후 추진계획
  - 2007.06.28일까지 공사완료 예정.

### 2. 회원농협 지원을 통한 농민 수혜 극대화 방안 강구 (농정과)

#### □ 지적사항

- 군에서 회원농협을 대상으로 지원하는 각종 사업 예산과 관련
  - 관내 주민들의 소득증대를 위해 회원농협에 지원하는 사업비가 지역주민(농민)들에게 환원되는 혜택이 미미한 것으로 판단됨
  - 향후 예산 지원시에는 농협과의 협의를 통해 많은 주민들에게 수혜가 돌아가도록 하는 방안을 강구하기 바람

## □ 처리계획

- 군지부장을 포함한 5개 회원 농협장 및 대관령원협장과 주기적인 협의회 개최를 통해 관내농산물 우선판매 등 농업인들에게 직·간접적인 도움이 되도록 함은 물론, 사업비 지원에 있어 농협별 경제사업 기여도 등을 참고하여 농가들에게 실익이 돌아갈 수 있는 사업이 우선 되도록 하겠음.
- 2008년 국·도비사업 및 향후 지원사업에 있어 사업계획 수립 및 신청 단계 전에 실태조사를 통해 해당지역 농가소득 기여도, 지역농업인 숙원사업 등 다각적인 검토를 실시하겠음.

## 3. 수해복구에 따른 토사(토석)채취 허가(산림과)

### □ 지적사항

- 지난해 발생한 수해복구를 위해 관내 많은 곳에서 토사(토석)채취가 이루어지고 있는 것과 관련
  - 산림훼손 수허가자들은 채토, 채석, 절토에만 관심을 두고 복구에 대하여는 관심이 부족한 것으로 사료됨
  - 산림과 등 관련부서에서는 모든 허가지역이 장마철 이전에 완벽한 복구가 이루어질 수 있도록 조치하기 바람

### □ 처리계획

- 수해복구용 토사채취허가내역 : 건수 : 75건, 면적 : 119ha.
- 문제점
  - 제출한 복구설계서의 복구공법, 공종이 현장에 적합하지 않아 보완을 요구하고 있으며,
  - 7개 읍·면에 75건이 산재되어 있어 현장 확인 및 지도가 어려움
- 처리계획
  - 우기가 다가옴에 따라 우선 복구설계승인후 복구작업을 진행하며 미비사항 및 변경사항 보완할 계획임.

## 4. 문화마을 뒤편 산지전용허가(산림과)

### □ 지적사항

#### ○ 문화마을 뒤편 산지전용허가와 관련

- 건조기인 요즘 적은 강수량임에도 토사가 흘러내리고 있는 점 등을 감안하여 불 때 본격적인 우기철에는 수해피해의 주요원인으로 크게 작용할 것으로 예상되는 바, 철저한 행정지도를 통해 우기전 완벽한 산림복구가 이루어질 수 있도록 하기 바람

### □ 처리결과

#### ○ 현재 복구작업 완료 : 5월말

- 녹생토 살포하여 토사유출 방지

## 5. 민원서류 처리의 일원화 체계 구축(민원봉사과)

### □ 지적사항

#### ○ 인·허가 민원서류 처리와 관련

- 주민들의 집단 반대에도 불구하고 허가 처리되는 민원이 있는가 하면, 불허 처리되는 민원도 있어 행정의 신뢰가 저하되고 있음
- 민원처리에 대한 명확한 기준 정립을 통해 모든 민원이 공정하게 처리될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 인·허가 민원은 주민들의 집단 반대의 유무에 불구하고 당해 민원의 적법여부를 기준으로 허가 또는 불허가 처리할 것이므로, 민원사무처리에 관한 기준이 되는 법률인 「민원사무처리에 관한 법률」과 행정절차에 관한 공통적인 사항을 규정한 「행정절차법」을 기준으로 하여(엄격하게 적용하여) 모든 민원을 공정하게 처리.

- 민원사무처리기준 실시간 공유체계 구축
  - 민원사무처리 관계 법령의 개정이 있는 경우 소관 부서에서 그 내용을 전 실과소·읍면에 즉시 전파
  - 민원처리시 유의 및 참고할 자료 등을 획득한 직원은 그 내용을 전 직원이 알 수 있는 방법(전자결재시스템 게시 등)으로 수시 전파  
(활성화를 위하여 민원처리에 유익한 자료를 제공한 직원에게 일정기준에 의거 “『직원평생학습 제도』의 학습시간” 이수를 인정하는 방안 등을 검토 추진)

⇒ 모든 민원이 통일된 기준으로 일관되게 처리케 하여 행정의 신뢰성 제고

## 6. 강민에너지 가스충전소 신축공사 (지역도시과, 산림과, 기획감사실)

### □ 지적사항

- 하진부2리 산202번지 가스충전소 신축으로 인해 발생된 집단민원과 관련
  - 산지 절개로 인한 사업부지내의 우수와 토사유출 및 축대붕괴 위험으로 인해 지역주민들이 민원을 제기하고 있는 바
  - 관련부서에서는 사업장 부지내 석축에 대하여는 전문기관의 구조안전단이 실시 될 수 있도록 하고, 절토된 사업장에 대한 우수 및 토사유출 방지책을 마련하고 추진되도록 지도점검을 실시하기 바람

### □ 처리계획

- 진부면 하진부2리 주민 집단민원 제기로 현지 확인한 결과 보강토 옹벽의 안전성 및 폭우시 우수 배수로 확보 등이 미흡한 것으로 판단됨에 따라

- 부지 내 우수 및 토사유출 방지를 위하여 부지면적을 추가 확보하여 추가된 부지에 토사유출 방지책을 강구하고 관련서류 제출하도록 지시함.
  - 지적 및 개선요구사항의 이행을 위하여 현재 시공된 공작물(높이 10m 가량의 보강토 옹벽) 전체를 재시공하거나, 토압 약화를 위하여 공작물 높이의 1/2이상을 철거 후 소단을 두고 부지내부로 이격시킨 후 공작물을 축조하도록 공사 지시
  - 공작물 재시공이 완료된 후 전문기관의 정밀구조안전진단을 득한 후 보고서를 제출하도록 하였으며,
  - 향후 지시사항 이행 및 지도점검을 위하여 지속적인 현지확인을 실시할 계획임

## 7. 장평지구 관문정비사업(지역도시과)

### □ 지적사항

- 우리군의 대표적인 관문인 장평이 평창군의 관문임을 알리기 위해 추진하는 관문정비사업과 관련
  - 그 동안 수 차례 장평관문정비사업의 중요성을 언급하고 우리군의 관문으로써 기능과 역할을 다할 수 있는 대책을 강구할 것을 요구하였으나 현재까지 용역비만 계상한 채 아무런 성과가 없는 것으로 확인되고 있음.
  - 관련부서에서는 관련기관과의 협의를 통해 조속한 시일내에 관문정비사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 장평관문정비사업과 관련하여 장평 IC 현지 확인 및 편입용지 등 기초조사를 완료하였으며, 2007. 5월 한국도로공사 강원지역본부에 직접 방문하여 관문정비에 필요한 사항을 협의하였음
- 관련기관(한국도로공사 등) 협의내용을 참고하여 2007년 6월 장평관문정비사업 실시설계용역을 우선 시행하고 감정평가 하여, 다각적으로 추진방안을 모색하겠음.

## 8. 흙탕물 저감 대책 강구(환경복지과, 건설과)

### □ 지적사항

- 관내 주요하천이 수해복구공사 추진으로 인한 흙탕물 유입으로 인해 탁도가 높아지고 있는 것으로 확인되는 바
  - 사업추진부서에서는 철저한 지도감독의 실시로 흙탕물이 저감될 수 있도록 특단의 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획(처리결과)

#### [환경복지과]

- 수해복구공사와 관련 지도·점검반을 편성하여 운영중에 있으며, '07. 5. 14일 현재 흙탕물 저감시설 미설치 및 미흡한 사업장에 대하여 6개소를 고발하였으며, 강원도 및 정선군과 합동점검시 위반 사업장 3개소에 대하여는 강원도에서 고발중임
- 흙탕물 발생 사업장 및 우려사업장에 대하여 행정지도 실시
  - 흙탕물 예방관리를 위한 협조 공문 발송 : 1회(실·과·소 및 읍·면)
  - 수해복구공사 관련 사업장 간담회 및 회의 개최 : 3회
    - ⇒ 진부면 사무소('07.3.14) : 시공업체 50여명 참석
    - ⇒ 평창읍 사무소('07.4.20) : 수해복구공사 감리단 21개소
    - ⇒ 용평면 사무소('07.5. 3) : 감리단, 시공사 대표 및 현장소장 등 약 70여명 참석
  - 흙탕물저감시설 우수사례 전파 및 설치협조 안내문 발송
    - ⇒ 원주지방국토관리청 및 수해복구공사감리단 21개소
- 수해복구공사와 관련 년중 지도점검을 실시하여 하천주변 및 하천 내에서 작업시 환경오염피해가 최소화 될 수 있도록 사전 오탉방지막 설치, 물길 돌리기작업, 침전지 설치 등을 반드시 이행하고 작업을 할 수 있도록 지도하고 이를 이행하지 아니한 사업장에 대하여는 관련법에 의거 적법 조치(고발 등)하여 쾌적한 환경이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음

## [건설과]

- 주요사업장별 흙탕물 저감대책 수립제출 : 2007.5.15
  - ※ 4월 20일, 5월 3일 2회에 걸쳐 감리단 및 시공사대표 회의를 개최, 흙탕물 발생이 최소화되도록 강력한 지시 촉구.

## 9. 평창초등학교 뒤 주택단지 조성공사(지역도시과)

### □ 지적사항

- 평창초등학교 뒤 단독주택과 아파트 신축 공사와 관련 옹벽 및 석축 시공 등에 대한 안전사고 위험이 우려되고, 공사장 주변 관리소홀로 지역 주민들의 생활안전을 위협하고 있음
  - 관련부서에서는 옹벽 및 석축에 대한 구조안전진단 등을 통해 위험요인을 사전에 점검하고
  - 공사장 진·출입 차량으로 인해 발생하는 비산먼지의 억제시설이 설치될 수 있도록 지도감독을 실시하고,
  - 공사장 환경 정비를 통해 지역 주민들이 편안하게 생활을 영위할 수 있도록 하기 바람.

### □ 처리계획

- 공사장에 대한 행정지도를 철저히 하여 불편함이 없도록 하겠음
  - 보강토 옹벽 시공 등에 대하여 공사완료 후 구조안전진단 실시.
  - 보강토 옹벽에 대한 공작물 축조신고.(평창읍사무소)
  - 비산먼지 억제시설 설치(환경복지과)
  - 공사장 주변 환경 정비
  - 사업계획 변경이 필요한 사항에 대하여 행정절차 사전 이행.

## 10. 건설자재 가격 지도단속 철저(기획감사실)

### □ 지적사항

- 우리군에서 생산되고 있는 건설자재(전석, 골재)와 관련
  - 산지 가격이 외지에서 반입되는 건설자재 가격보다 높아 지역 업체의 수해복구공사 추진에 많은 부담이 되고 있으며 이로 인해 수해복구공사의 부실시공으로 이어질 수 있는 만큼
  - 관련부서에서는 철저한 지도단속을 통해 시정될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 최근 원유가격을 비롯한 원자재가격 상승과 수해복구 공사로 인한 수요증가로 일부 자재의 품귀 현상이 빚어지면서 지역 건설자재의 가격 상승이 있었던 것으로 판단되며 이에 따라 건설업체에서도 다소의 어려움이 있을 것으로 사료됨.
- 그러나 1999년 공산품 등의 가격자율화 시행 이후 각종 가격에 대한 자치단체의 권고사항에 불과하여 가격 상승과 관련하여 실질적인 지도단속이 어려운 실정이며, 수요와 공급에 의하여 형성되는 시장가격을 법률 등에 근거없이 자치단체가 개입하는 것은 지역경제에 부정적인 영향을 미칠 우려도 있음.

## 11. 도시계획도로(중로 3-1호) 개설공사(지역도시과)

### □ 지적사항

- 대화 삼양의원을 지나는 도시계획도로 개설공사와 관련
  - 공사구간내 지장물(삼양의원) 보상 협의 지난 등의 사유로 노선을 변경하여 우회하는 계획은 도시기반조성 및 도로개설 사업목적에 반하는 행정이라 사료되며, 원만한 사업추진을 위한 사업부서의 다각적인 검토 노력이 필요함



## □ 처리계획

- 2007년은 대화국유림관리소 ~ 대화중·고등학교 구간을 추진 중에 있으며, 대화도시계획도로(중로3-1호)개설공사 편입되는 구간 중 대화 삼양의원 건축물에 대하여는 '03년 감정 시 막대한 사업비가 소요되어 보상비를 지급하지 못하였으며, '07년도에 재 감정평가 등 다각적으로 검토하겠음.

## 12. 대화1리 소교량 수해복구 공사(대화면)

### □ 지적사항

- 집중호우로 유실된 세월교를 철거하고 가교를 설치한 것과 관련  
- 가교의 난간이 미관을 저해하고 있어 대화면을 지나는 내방객들에게 대화면의 이미지를 실추시킬 것으로 판단되는바 이에 대한 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 가교의 난간 입구 및 끝 부분에 대화를 상징할 수 있는 조형물 설치하여 경관 조성  
예) 대화의 농특산물 상징물 : 대화초  
동계올림픽 관련 상징물 : 눈동이
- 또한 경관조성에 대한 다양한 주민의견 수렴후 실시

## 13. 평창강(2급하천) 제3지구 수해복구공사(건설과)

### □ 지적사항

- 상안미 선애교 위에서 추진중인 평창강 제3지구 수해복구공사와 관련  
- 수해를 입은 지역은 좌안임에도 우안을 정비하고 있어 수해 재 피해가 예상되는 만큼 좌안에 대하여도 제방정비 사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람.

## □ 처리계획

- 좌안의 축제고가 우안보다  $H = 1.0 \sim 2.0m$  낮게 되어있어 홍수 시 범람의 우려가 있으므로, 제방을 보축코자 상안미1리 이장 및 토지소유자와 보상관계 협의 완료 후 실시설계 중임.

## 14. 준도시 취락지구 사업(지역도시과)

### □ 지적사항

- 미탄면 시가지 일원에서 추진중인 준도시 취락지구 사업과 관련
  - 지난해 하반기 현지 확인시 올해 추진하겠다고 약속을 하였으나 현재까지 예산조차 확보하지 않고 있어 주민들의 불만이 표출되고 있는 것을 감안 관련부서에서는 각별한 관심을 가지고 조속한 시일 내에 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

### □ 처리계획

- 2007년 4월 창리 취락지구개발사업의 일환으로 도로개설(정비)  $L=308m$ (노인회관~면장관사  $L=198m$ , 대림장~청산구간  $L=110m$ )를 완료하였으며, 미개설 구간에 대하여 2008년 당초예산을 확보하여 추진되도록 노력하겠음.

## 15. 평창군 폐기물종합처리시설 설치공사(환경복지과)

### □ 지적사항

- 미탄면 창리 도마치골에서 추진중인 폐기물종합처리시설 설치공사와 관련
  - 그간 주민들의 반대와 시공업체의 부도로 인해 사업이 계획보다 지연되었음을 감안 관련부서에서는 계획된 공기내에 완공될 수 있도록 각별한 관심을 가지고 사업을 추진하기 바람

- 반대투쟁위원회 활동으로 인해 폐기물처리장 시설사업 추진이 지연되고 이로 인해 대화매립장을 대체부지로 활용함에 따라 발생한 손실비용과 소송비용 지출 등에 대하여는 손해배상청구 대책을 강구 하기 바람
- ※ 불특정다수의 주민들이 참여의도없이 한 행위는 제외하고, 직접적인 군비 손실부분에 대하여는 손실부분이 보전될 수 있도록 소송을 제기할 것

## □ 처리계획

- 대화위생매립장 2년 연장 사용에 따른 손실비용은 평창군에서 소송 패소하여 불가피하게 발생된 비용으로 청구가 불가능함
- 소송 패소이후 행정절차 재이행하여 수행된 소송은 4건(항소심 포함 총 7건, 평창군 전부승소)으로 취소소송은 주민 취하로, 효력정지소송은 판결문에 소송비용 언급이 없는 관계로 청구가 불가능하며, 손해배상청구 소송비용은 6,600천원이나 원고가 668명으로 사실상 청구가 불가능함.
- 공사방해금지 가처분 소송에 대한 소송비용 및 손해배상 청구 여부는 집행기관 내부적으로 별도 검토를 한 다음 처리할 계획임.

## 16. 마하 생태주택관 조성사업(지역도시과)

### □ 지적사항

- 많은 예산을 투자하여 조성된 마하 생태주택관 시설이 민물고기 생태관과의 연계 관리를 이유로 현재까지 활용되지 않고 있는 것과 관련
  - 오랜 방치와 시설관리 미흡으로 인해 건물에 누수가 발생되고, 우수처리시설이 지면보다 높아 건물로 우수가 유입되고 있는 등 발생한 문제점에 대한 보수공사를 실시하고, 관리책임자를 지정하여 철저한 관리를 기하도록 하기 바람

## □ 처리계획

- 2007년 상반기내에 민박동 신축공사를 완료하여 생태 주택관과 민박동을 마하리 자치위원회에 무상위탁 계약을 체결하여 관리토록 할 계획이며, 향후 민물고기 생태관이 완공된 후에는 환경복지과와 협의하여 군에서 일괄 운영·관리하도록 할 계획임.
- 시설물에 대한 누수 등의 문제점에 대하여서는 시공업체에 통보를 하여 보수방법에 대한 대책을 감리 및 시공사와 협의하여 조속한 시일 내에 보수 조치하도록 하겠음.

## 17. 민물고기 생태관 건립사업(환경복지과)

### □ 지적사항

- 민물고기 생태관 건립사업의 추진이 지연되고 있는 주요 원인인 암반 발생에 대한 것과 관련
  - 설계업체가 설계시 지질조사 6공을 실시하였다고 하나 전반적인 암반층 지역임에도 지질조사를 소홀히 하여 약 6억 5천만원의 추가 사업비가 소요되고 공사가 지연되고 있는 등의 문제를 발생하게 한 설계업체를 상대로 손해배상청구 등의 방안을 강구하기 바람

### □ 처리결과

#### [토목 지질조사 소홀여부 판단]

- 암 판정 현황
  - 설계시(샘플 6공 시추) 암 판정은
    - : 암 총량 14,229m<sup>3</sup> 연암 14,229m<sup>3</sup>, 경암 0m<sup>3</sup> 암파쇄 공정
  - 실제 공사시 암 판정은
    - : 암 총량 17,796m<sup>3</sup> 연암 99m<sup>3</sup>, 경암 17,697m<sup>3</sup> 암발파 공정
- 지질조사 소홀여부 판단
  - 시추된 6공의 암량은 샘플시공을 감안하여 오차 범위가 적고 설계 당시에도 발파 부분이 검토된 바 있으나 예산에 맞춰 파쇄공정으로 설계하였음. 따라서 잘못된 지질조사로 판단하기 어려운 상황임

## [건축시각의 판단]


○ 현재의 암 판정이 건축설계에 미치는 영향

- 현장여건은 경사각 약 15°~25°로써 하부 평지레벨, 건물, 어종연구 시설 등을 안정성 있게 지하층까지 터파기 약11m로 설계됨으로써 건물과 경사지의 특성을 고려한 최소한의 굴착임.
- 현재의 암 판정으로 인해 사업비 과다소요 등의 이유로 터파기 굴착 깊이를 축소하고 하부 평지를 되메우기 하여 건물을 들어 올린다는 개념은 안정성의 이유로 타당하지 않다는 전문가의 의견임.
- 따라서 현장 특성상 설계 시추와 현재 암판정 상관없이 굴착할 수밖에 없는 상황임

※ 자문 전문가 : 설계자 토담건축사사무소, 책임감리단 도우엔지니어즈

## [경사각 에서의 건물 신축 상황도]

○ A, B : 1번 절토없이 공사, 2번 하부되메우기 공사, 3번 하부 평지에 맞춰 공사 ,

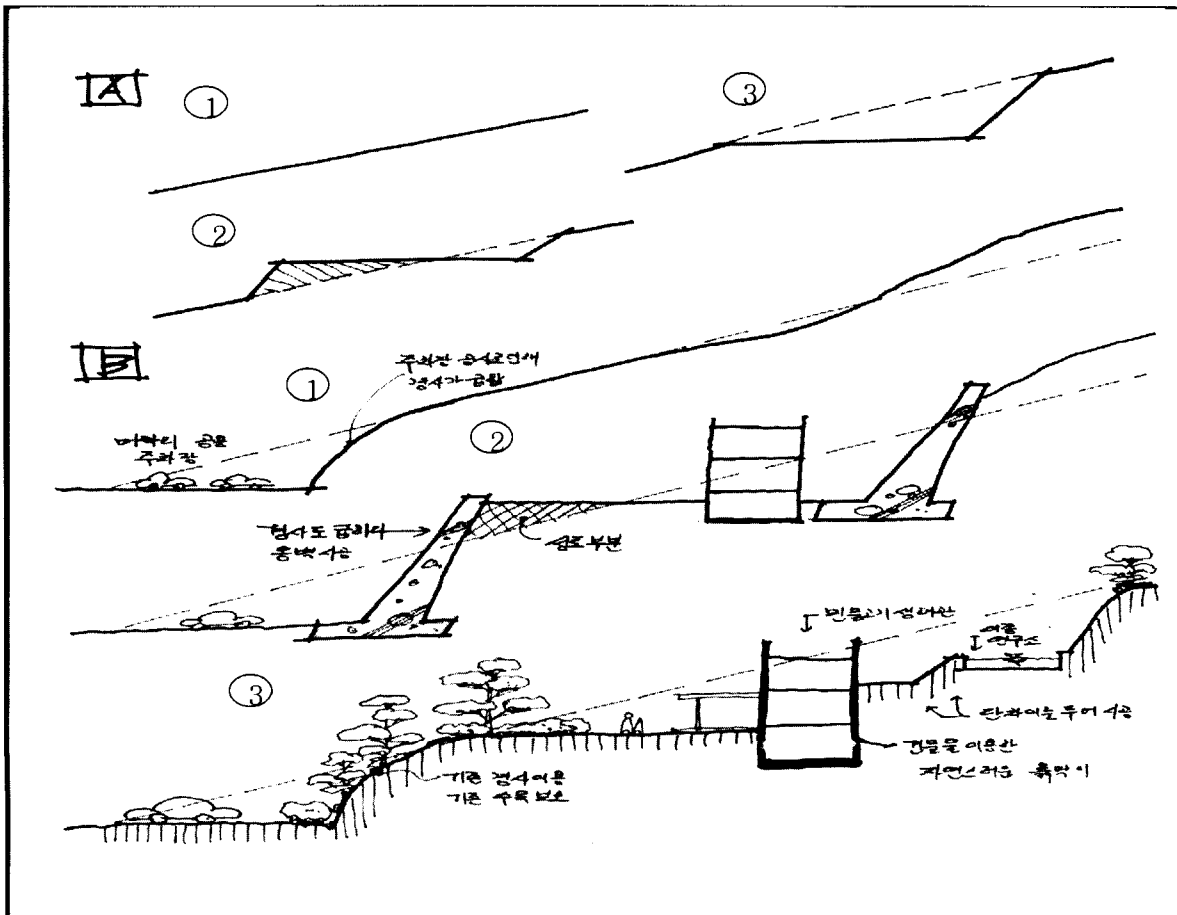

## [종합의견]

- 현재 압 판정 압선이 당초 시추 6공에 대한 부분과 샘플 시공을 감안하여 오차가 적음으로 잘못된 시추로 인해 사업비 증가요인으로 손해배상 청구는 불가능한 상황이며, 또한 생태관 현재부지는 건물 경사지 특성을 이용한 최소한의 굴착으로 설계된 만큼 잘못된 시추에 의한 설계 소홀로 볼 수 없는 상황임

## 18. 수해복구사업 참여업체의 부도에 따른 지역상인 보호대책 마련(재무과, 건설과)

### □ 지적사항

- 관내 토목사업 시공업체와 신용으로 거래하는 지역 상인들이 업체의 부로도 인해 거래대금을 받지 못하는 사례가 발생함에 따라
  - 계약 부서 및 사업주관부서에서는 시공업체의 동향을 면밀히 감시하고, 외지업체에 대하여는 준공처리시 지역 상가에 미수금이 없는지 확인 후 사업비를 지출 등을 통해 지역 상인들이 피해를 받지 않도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

#### 【재무과】

- 수백 건의 수해복구사업이 계약·추진되고 있어 위의 지적사항이 공사 완료시까지 심히 우려됨.
  - 향후 예측되는 점을 고려하여 계약부서와 사업추진부서, 감독공무원 등이 노임과 자재대, 장비임차료 등 미납사항에 대해 감시감독을 강화하고 있으나 업무의 과중 등으로 세밀하게 파악하지 못하고 있는 실정임.

- 이와 관련하여 시공회사의 선급금 · 기성금 · 준공금 등의 대금 청구시 공사감독 공무원과 긴밀한 협조로 사업장의 소재 마을이장 또는 현지주민 등의 여론수렴을 통해 체불금이 있는지 여부를 확인한 후 사업비가 지출되도록 하여 지역상인 등이 피해를 받지 않도록 노력하겠음.
- (공사건에 대하여 2007년 5월말 현재 부도 등에 의한 피해신고는 접수되지 않은 상태임)

### 【건설과】

- 도로, 하천, 수리시설 등 13개 감리단 21개사에 사업장별 참여업체 부도에 따른 지역상인 보호를 위한 대책을 강구토록 협조공문 발송(2007.05.08)

## 19. 덕거천 수해복구공사(건설과)

### □ 지적사항

- 봉평면 덕거리 일원에서 추진하는 덕거천 수해복구공사와 관련
  - 수해복구공사시 덕거리 2리 잠수교는 철거 계획으로 있으나 이를 재가설할 계획이 없음에 따라 이를 이용하는 지역주민들이 불만을 호소하고 있는바 잠수교 철거시 교량이 설치될 수 있도록 대책을 강구하기 바람
  - 김형남씨 집 앞 ~ 잠수교까지의 하천선형은 문제가 있다고 확인된바 하천선형을 변경하여 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

### □ 처리계획

- 시행중인 덕거천수해복구공사에 기존 잠수교 상류부에 교량가설(L=52m)이 계획되어 있으며,
  - 김형남씨 주택마당 협소부분은 하천선형을 하천쪽으로 3m 이동, 축제시공 할 계획임.

-2007 상반기 군정주요사업장 현지확인-

# 개선요구사항 처리계획

## 1. 황계 도시계획도로(소로 2-7, 3-8호) 개설공사 (지역도시과)

### □ 개선요구사항

- 도암면 황계리 일원에서 시행중인 도시계획도로(2-7, 3-8호) 개설공사와 관련
  - 짧은 구간임에도 불구하고 지장물 보상 및 시설철거 후 방치로 인해 도시 미관을 저해하고, 올리브 프라자 옆 마을 진입로 폐쇄로 주민들이 통행불편을 겪고 있음에 따라
  - 관련부서에서는 적극적인 의지를 가지고 사업을 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람
  - 사업 우선순위는 지역주민의 애로사항이 있는 부분을 우선적으로 해결될 수 있도록 소로 3-8호 사업 완료 후 소로 2-7호가 아닌 2-8호가 먼저 개설토록 추진하기 바람

### □ 처리계획

- 2007년은 올리브플래닝 구간(감자축제장 진입로)중 먼저 황계도시계획도로(소로3-8호)개설공사를 추진 중에 있으며, 본 사업이 완료되면 '08년도 사업시행은 주민 및 도암면의 의견을 수렴하여 우선 사업시행노선(소로2-8호, 소로2-7호)을 선정하여 추진토록 할 계획임



## 2. 군도 15호선 수해복구공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 도암면 수하리 일원에서 추진중인 군도 15호선 수해복구공사와 관련
  - 현재의 교통량은 도로개통 당시 교통량과는 비교할 수 없을 정도로 증가된 노선임을 감안 수해복구공사시 많은 곳에 노선이 확보될 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람

### □ 처리결과

- 추진 중인 군도15호선 내역에 반영, 차량 교차가 가능하도록 15개소를 금회 설계내역에 반영하였음(완결).

## 3. 군도 12호선 수해복구공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 군도 12호선 수해복구공사 추진과 관련 사업추진부서와 주민간의 의사소통 부족으로 인해 사업추진에 차질을 빚고 있는 것으로 확인 되는 바
  - 도로에 편입되는 토지·건축주 및 지역 주민들을 대상으로 사업 설명회 개최 등을 통해 주민의 의사를 수렴하고 민원 해결책을 모색하여 조속한 시일내 사업이 완료될 수 있도록 하기 바람

### □ 처리결과

- 실시설계를 완료하여 지난 3. 15일 도암면사무소에서 군도 12호선 수해복구사업 전체에 대한 일괄 설명회를 실시하였으며,
  - 용산2리 일부 주민(최종복, 이길)에 대한 부분설명을 5. 15일 현장에서 실시, 이해하였음(완결).

## 4. 농경지 수해복구 감독 철저(건설과)

### □ 개선요구사항

- 농경지 수해복구 사업이 마을별 복구위원회를 중심으로 추진되면서 토사배급 및 복구비용 분배 등으로 인해 지급 주민간 갈등과 분쟁이 빈발하고, 정산 착오로 인한 선의의 피해를 입는 주민들이 발생할 것으로 예상되는 바
  - 담당부서에서는 이에 대한 사고를 미연에 방지할 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람
  - 농경지 수해복구를 마사토로 하고 있음에 따라 예상되는 마사토 유실로 인한 제2의 수해피해의 예방을 위해 경사지나 절개지 등을 대상으로 풀씨 파종 등의 실시로 토사유출 방지대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 마을별 공동복구추진위원회에서 재난지원금 정산방법, 완료시기 등을 민주적인 방법으로 회의를 통하여 결정할 수 있도록 「농경지복구추진지침」으로 규정하고 있으나,
  - 선의의 피해를 입는 주민이 발생하지 않도록 읍·면장으로 하여금 마을별로 행정지도 및 문제점 파악, 군과 협의 하도록 지시 (5. 22, 6. 7 읍면장 회의, )
- 농경지 법면의 토사유출 방지를 위하여는 지구별 공법, 대책 등을 강구 무기전까지 파악 후 농경지 복구 잔액으로 정비추진코자 함

## 5. 누락된 수해피해사업장에 대한 수해복구 전력(건설과)

### □ 개선요구사항

- 지난해 7월 사상 유래없는 수해로 인해 관내 많은 지역이 수해를 입은 것과 관련
  - 수해를 입은 지역임에도 피해 조사 당시 조사누락이나 사업비 삭감으로 인해 수해복구를 추진하지 못하는 곳이 상당수 있는 것으로

확인되는 바 중앙부처 및 강원도와의 긴밀한 협의를 통해 수해 피해를 입은 모든 사업이 추진될 수 있도록 각별한 관심을 기울이기 바람

#### □ 처리계획

- 읍·면장 건의 및 감리단을 활용, 누락되거나 꼭 필요한 사업장에 대하여는 현지조사를 실시하여 잔액 등을 활용하여 추가 시행하고자 함.

### 6. 지역 건설업체 수해복구 참여방안 강구(재무과,건설과)

#### □ 개선요구사항

- 지난해 수해피해로 인해 관내에서 5천억원이 넘는 재정이 투자되어 수해복구 공사를 추진하고 있는 것과 관련
  - 수해피해발생 당시 군이하 행정기관에서는 지역업체를 상대로 응급복구를 지시하여, 모든 지역업체가 위험을 감수하고 수해피해가 최소화될 수 있도록 응급복구에 적극 참여하였으나, 수해복구 공사 입찰에서는 지역업체의 참여 기회가 배제되고 있는 실정임을 감안 지역 업체가 수해복구공사에 참여할 수 있는 방안을 강구하기 바람

#### □ 처리계획

##### 【재무과】

- 지난해부터 수차례에 걸쳐 지역업체 보호차원에서 대책을 마련하기 위해 관심을 갖고 업무를 추진해오고 있으나 가시적인 성과·대책 마련은 미흡한 실정임.

##### <그간의 추진성과>

- 2006년 7월 수해 이후부터 시군 소재 영세업체 보호를 위한 소액 수의계약금액 상향 조정요구를 상급기관 등의 채널을 통해 건의하였음. 현재 국가계약법이 개정되어 관내 수의견적 입찰금액이

일반건설업은 1~2억, 전문건설업 7천~1억, 물품용역 3~5천만원 이하로, 그밖에 1인 견적 수의계약은 일반공사 1~2천, 물품 · 용역 5백~2천만원 미만으로 상향조정되어 2007년 1월부터 시행 중임. 또한 행정자치부에서 「지방계약법시행령」 개정을 위해 2007. 5.18 입법예고를 마쳐 6월 중 개정하여 금년 7월부터 시행할 예정이다.

- 또한 소액수의계약시 계약부서와 사업부서가 협의하여 수해응급 복구 등에 참여한 지역업체가 작은 사업이라도 참여할 수 있도록 노력하겠음.
- 또한 우리 군에서는 지역영세업체보호 및 지역경기 활성화를 위해 공사에 사용되는 각종 자재를 평창군 관내에서 생산 · 판매되는 자재를 사용하도록 하고, 생산 · 판매되지 않는 자재는 강원도 내에서 구매하여 사용해야 한다는 조항과 각종 노임 및 자재 대금, 장비 임차료 등에 대한 체불로 민원 발생할 경우 수의계약 체결시 제한을 받도록 하는 공사계약특수조건 제 16조 ①~③항을 신설하여 금년 3월부터 시행하고 있음.

## **【건설과】**

- 현재 법으로는 수의계약이 어려우므로 관내 업체 참여를 위해 가능한 사업장 분리발주를 하고 있음.

## **7. 송정1리 소하천 수해복구 공사(건설과)**

### **□ 개선요구사항**

- 송정1리 소하천 수해복구공사 추진과 관련
  - 설계서를 보면 하천의 하폭이 상류는 넓고 하류는 좁아지는 형태로 사업이 추진되고 있어 수해가 재발할 위험이 있다고 확인된바 하류지역 하폭을 확장하여 공사가 추진될 수 있도록 하기 바람.

### **□ 처리계획**

- 하폭 협소구간은 지장물이나 토지 보상 후 하폭을 확장 시공할 계획임.

## 8. 진부 도시계획도로 개설공사(지역도시과)

### □ 개선요구사항

- 진부면 상진부리 혜청빌라 옆에서 추진하는 도시계획도로 개설 공사와 관련
  - 우회도로와 마을내 도로가 연결되어 있지 않아 지역주민들이 통행 불편을 겪고 있음에 따라 우회도로와 마을내 도로가 연결될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 2007년은 진부초등학교~진부농협 구간의 진부도시계획도로(소로 2-10호)개설공사 추진 중에 있으며, 상진부리 혜청빌라 옆 도시 계획도로(소로3-20호)는 금년에 우선 실시설계용역을 시행하고 감정평가 후 예산을 확보한 후 추진하고자 함.

## 9. 거문·상월오개 종합개선지구 수해복구공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 거문리 거문초등학교 인근에서 추진하는 수해복구공사와 관련
  - 거문초등학교 옆 도수로가 수해복구계획에서 누락되어 있어 하절기 우수로 인해 농경지의 피해가 예상되는 만큼 거문·상월오개 종합개선지구 수해복구공사 추진시 도수로 공사 병행 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 거문 · 상월오개 종합지구 포함이나 별도 발주하여 추진하겠음.

## 10. 도사리(곧은골) 소하천 수해복구 공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 강원도 발주로 추진중인 도사리(곧은골) 수해복구사업과 관련
  - 하폭 확장으로 인해 기존의 교량은 철거되었으나 이에 대한 재가설 계획이 없어 주민들의 생활불편이 야기되고 있는바 강원도와의 긴밀한 협의를 통해 수해복구로 철거된 교량이 재가설될 수 있도록 하기 바람

### □ 처리계획

- 강원도에서 발주시행 중인 도사천(3-1제)수해복구공사나 군에서 별도계획 수립, 추진하겠음

## 11. 문화복지센터 건립사업(환경복지과)

### □ 개선요구사항

- 평창군민들의 문화 욕구를 충족하기 위해 추진하고 있는 문화복지센터 건립과 관련
  - 본 사업은 도비 50%를 지원받아 추진하기로 계획되었으나, 추진 과정에서 도비 삭감으로 인해 군비 투자가 불가피한 것으로 확인된바, 관련부서에서는 우리군의 어려운 재정형편을 감안 도비를 확보하여 사업이 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 사업개요
  - 위 치 : 평창읍 하리 113-1번지
  - 사업량 : 4,242㎡
  - 사업비 : 7,618백만원

○ 사업 추진현황

- 투융자심사승인 : '06. 05.
- 건축설계 착공 : '07. 02. 21.
- 설계완료 : '07. 06. 20.
- ※ 설계자 : (주)유신건축

○ 문화복지센터의 적기추진을 위하여는 재원확보가 가장 중요하며,

- 안정적인 재원확보를 위하여 중앙부처 및 상급기관과 긴밀히 협조하여 재원확보토록 지속 노력하겠음.

## 12. 속사지구 집단이주마을 기반조성공사(지역도시과)

### □ 개선요구사항

- 수해로 인해 보금자리를 잃고 집단 이주를 위해 추진하는 집단 이주마을 기반조성과 관련
  - 집단이주 및 농가주택 신축을 위한 행정절차 대행 등의 적극적인 행정편의 제공으로 동절기 이전 모든 주민이 입주할 수 있도록 공사추진에 만전을 기하기 바람

### □ 처리계획

- 집단이주마을 기반조성 공사는 준공기일이 2007. 7. 10까지이나, 준공기일을 2007. 6. 30까지 준공되도록 독려중이며, 2007. 5월부터 이주단지 입주 대상자를 상대로 건축하도록 홍보 및 지도를 하여 동절기 이전에 입주 할 수 있도록 각종 서류 작성 등을 지원하고 있음.
- 2007.5.22 기준으로 14동이 착공 중임.

## 13. 입탄리 농어촌도로 포장공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 도로의 교통량은 적으나 노면상태 불량으로 인해 이 도로를 이용하는 지역 주민과 내방객들이 통행불편을 겪고 있음에 따라
  - 관련부서에서는 조기 확·포장 될 수 있는 방안을 강구 바람

### □ 처리계획

- '07년도 소교량가설 및 접속도로를 450m 포장 중에 있으며, 잔여 미포장구간 1.5km에 대하여는 마을길포장사업 계획에 반영, 연차적 포장 추진할 계획임.

## 14. 가로수 조성 사업(산림과,지역도시과)

### □ 개선요구사항

- 관내 시가지에서 시가지 가로수 대부분을 은행나무로 조성하고 있는 것과 관련
  - 이 수종은 타 수종에 비하여 성장성이 뛰어나 전선을 건드리고 상가 간판의 시야를 저해하여 상인들이 불만을 호소하고 있는바 향후 가로수 조성시에는 은행나무를 지양하고 우리군의 이미지 및 기후에 적절한 수종으로 조성하기 바람
  - 중앙분리대를 설치하는 도로에서는 사업추진상 가능하다면 이를 이용 가로화단 조성 방안을 검토하고
  - 평창읍 향동리 입구에 조성된 소나무가 솔잎혹파리로 인해 고사되고 있음에 따라 이에 대한 치료 및 대체수종으로 조성하는 방안 강구



## □ 처리계획

### 【산림과】

- 신규 가로수 조성사업에 있어서 우리군의 기후 및 토양구조상태, 도로여건, 주변경관을 고려하여 청정 고향의 이미지를 부각시킬 수 있는 특화된 향토수를 노선별·읍면별 선정하여 조성코자 하며,
- 현재 조성되어 있는 20년된 은행나무 가로수는 가지치기 및 맹아제거 작업을 매년 실시하여 아름다운 수형유지 및 녹음경관을 조치하겠음.

### 【지역도시과】

- 향후 추진하는 도시계획도로(대로) 개설사업 시행 시 현 상황을 고려하여 중앙분리대 설치나, 도로중앙에 가로수 식재 등 가로화단조성을 적극검토 하겠으며,
- 향동리 입구에 조성된 소나무는 솔잎혹파리방제 등 사후관리에 만전을 기하도록 하겠음.
- 수종갱신여부는 당초 지역주민의 화합된 의견을 모아 식재되었으므로 가로수(소나무) 생육상태 등을 검토하여 처리토록 하겠음

## 15. 주진~용항간 군도 확·포장 공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 2006년부터 추진중인 주진~용항간 군도 확·포장공사와 관련
  - 주진리 마을회관 옆에서 주진교 구간의 도로 계획고의 상향조정으로 인해 지역 주민들이 주택의 피해를 우려하고 있음에 따라
  - 주택피해가 발생되지 않도록 공사 추진에 만전을 기하기 바람

### □ 처리계획

- 주민 통행불편 및 주택진입 불편을 해소하는 방향으로 검토 추진할 계획임.

## 16. 평창하수종말처리장 시설공사(상하수도사업소)

### □ 개선요구사항

- 평창읍 시가지의 하수처리를 위하여 추진중인 평창하수종말처리장 시설공사 추진과 관련
  - 향동리 청성애원 상류 지역과 후평리에는 많은 주민들이 거주하고 있음에도 하수처리구역에서 누락된 것은 부당하다고 확인된바 누락지역이 하수처리구역에 편입될 수 있도록 각별한 관심을 기울여 사업을 추진하기 바람

### □ 처리계획

- 평창하수종말처리장 시설공사는 환경부에서 승인된 하수도정비 기본계획에 의거 하수처리구역으로 결정된 구역내 기존가옥을 대상으로 사업계획을 수립 시행하여야 하기에 환경부 방침에 의거 동구역을 대상으로 환경관리공단과 협약을 체결하여 위탁 시행하고 있는 사업으로 2009년말까지 완공예정으로 추진중에 있으며
- 하수처리구역외인 향동리와 후평리 지역은 금년도 하반기에 시행 예정인 하수도정비 기본계획 변경시 하수발생량과 상주인구등 처리구역 포함여부를 종합적으로 검토하여 단계별로 추진되도록 하겠음

## 17. 하안미1리 소교량 수해복구 사업(건설과)

### □ 개선요구사항

- 하안미1리에서 대화8리 범구마을 진입로로 이용하는 세월교가 하천정비계획에 의거 철거되고 하폭 확장으로 인해 하천부지내 가옥의 철거가 불가피한 것과 관련
  - 관련부서에서는 사업시행전 하천부지내 거주 주민들의 이주 등의 대책을 강구하기 바람

## □ 처리계획

- 범구마을 진입 교량은 수해복구사업으로 추진코자 실시설계중이며, 하천수해복구에 편입되는 가옥은 4가구로 기 보상통보가 완료되어 조속한 시일 내 이주예정이며, 현재 1가구는 이주 완료된 상태임.

## 18. 몽골유목문화관광체험장 조성공사(축산과)

### □ 개선요구사항

- 대화면 하안미5리에 조성중인 몽골유목문화 관광체험장과 관련
  - 이 시설은 하안미 지역 주민 1,000여명이 식수로 이용하는 간이상수도 상류에 위치하고 있어 우기철 마분과 관광객들의 생활오수로 인해 간이상수도가 크게 오염 될 수 있음을 감안 관련부서에서는 해당 사업장에 대한 철저한 지도·감독을 통해 간이상수도가 오염되지 않도록 각별한 관심을 갖고 사업을 추진하기 바람

### □ 처리계획

- 해당사업장에 대하여 마분처리는 마분수거 퇴비장시설을 설치하여 밖으로 유출되지 않도록 하고, 생활오수는 정화시설을 갖추어 식수원이 오염되지 않도록 하여 사후관리 지도에 철저를 기하겠음.

## 19. 지역경기 활성화를 위한 패키지 관광상품 개발(문화관광과)

### □ 개선요구사항

- 동막골 영화세트장은 영화효과로 그간 많은 관광객들이 다녀갔으나 지역경기 활성화에는 실질적인 영향을 주지 못하고 있는 것으로 확인된바
  - 백룡동굴, 생태주택관, 래프팅, 양떼목장, 금당계곡, 월정사 등 우리군 전역의 관광자원을 연계한 패키지 관광상품을 개발하기 바람

## □ 처리계획

- 방문객 통계 : 2005년도 약 71,000명, 2006년도 122,000명
- 관광홍보물 : 입체지도 25,000부, 종합관광가이드북 3,000부, 평창관광 맛보기 50,000부, Yes-평창 길라잡이 1,000부 등 제작
- 각종축제시 관광상품 패키지 제공( 10회 ) - 여행사 관광상품
- 테마별여행상품모음집 제작 활용
  - 신나는 평창 ~ Yes ! 평창 ~ : 1,500부(국내여행사 상품제공)
- 관광안내소 설치 운영 : 1개소(영화세트장 입구)
- 안내원 1명 배치 : 영화세트장 설명 및 평창관광 안내

## □ 향후 추진계획

- 마하지구생태관광지 개발과 주요관광자원을 활용한 홍보마케팅으로 관광지와 연계한 프로그램 및 관광상품 개발로 지역경기 활성화 및 소득증대에 기여.

## 20. 공공시설물 관리비용 절감 대책 강구(재무과)

### □ 개선요구사항

- 평창군의 신축하는 공공시설물과 관련
  - 평창군의 지방세는 지난 10년간 20여억원이 증가하였으나, 공공시설물은 기하급수적으로 신축되고 있어 앞으로 공공시설물 관리비 등의 고정비가 군의 재정에 부담을 안겨 줄 것으로 판단되는 바
  - 공공시설물에 대한 총체적 관리계획 수립을 통해 고정비용 절감 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 공공시설물 설치가 종합적인 계획 없이 설치되어 설치비용은 물론 유지 관리비 부담이 지방재정운용의 부담요인이 되고 있다는 사실을 공감하고 있음.

- 이에 대하여 우선 기 건립된 공공시설에 대한 관리실태점검을 2007년 6월말까지 실시하고 이를 토대로 종합적인 공공시설물 설치 및 유지관리 종합대책을 마련하여 7월부터 시행하겠음.
- 이 대책을 시행하면서 제도적인 뒷받침이 필요하다고 판단되면 「지방자치법」 제144조제2항에 근거하여 가칭 공공시설 설치 관리 조례를 제정하는 것도 검토하여 나가겠음.

## 21. 계촌마을하수도 시설공사(상하수도사업소)

### □ 개선요구사항

- 계촌리 일원에서 추진중인 마을하수도 공사 추진과 관련
  - 중앙의 예산배정 지연으로 공사가 연기되고 이로 인해 이와 연계된 다른 공사의 시행도 지연되고 있는 것으로 확인되는 바 일률적인 사업추진은 지양하고 소액으로 단기간내 완료될 수 있는 공종에 대한 선 시공을 통해 주민불편 해소 대책을 강구하기 바람.

### □ 처리계획

- 계촌마을하수도는 처리장 건축과 주관로 시설을 완료하고 시운전 중이나, 도로점용 허가조건 이행 및 시설공사 물가변동으로 사업비가 증가됨에 따라 배수설비등이 일부 미시공되어 처리장 가동이 지연되고 있는 실정임
- 따라서 국고 추가 사업비에 대하여는 환경부에 총사업비 변경 요청 하였으며, 처리장을 조기에 운영하고자 시공사 (주)동서와 협의하여 사전 전시공 승인(07. 5. 17일) 완료하였기 '07. 8월말까지는 모든 공사가 완료되어 처리장이 정상가동 되도록 하겠음

## 22. 봉평 중·고등학교 이전사업(재무과)

### □ 개선요구사항

- 봉평 중·고등학교 이전사업이 강원도의 도시계획 심의과정에서 부결되어 지금까지 지연되었지만
  - 면민들의 숙원사업임을 감안 조속히 행정절차를 재개하여 사업이 조기 추진될 수 있도록 대책을 강구하기 바람

### □ 처리계획

- 봉평 면민들의 숙원사업인 봉평 중·고등학교 이전사업 촉진을 위한 제반 행정지원업무에 최선을 다하겠음.
- 이를 위하여 유관부서 부서장으로 행정지원협의회를 구성하여 파생되는 제반 문제를 협의 해결해 나가도록 하겠음.

## 23. 친환경 제방공사 추진(건설과)

### □ 개선요구사항

- 동일 하천 제방을 옹벽, 석축 등의 여러 가지 공법을 병행 시행함으로써 평창군의 청정하천의 미관을 저해하고 있음
  - 동일 하천에 대하여는 같은 공법을 이용 제방공사를 시행하기 바람, 주변경관과 조화를 이루는 친환경 제방공사가 추진될 수 있도록 각별한 관심을 갖고 사업을 추진하기 바람

### □ 처리계획

- 주변과 조화를 이루는 자연친환경적인 호안공법을 검토하겠음.

## 24. 평촌천 수해복구공사(건설과)

### □ 개선요구사항

- 봉평면 평촌리 일원에서 추진하는 평촌천 수해복구공사와 관련
  - 수해복구비 부족으로 인해 사업 추진이 지연됨에 따라 우기시 재피해가 예상되는바 조속한 시일내에 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

### □ 처리계획

- 실시설계 완료 후 예산부족으로 미발주된 사업이나 예산잔액을 판단, 조속 발주되도록 하겠음.

## 25. 봉평면 관문 직선화사업 적극적 검토(건설과)

### □ 개선요구사항

- 관광도시로서 발전하고 있는 봉평면 지역의 관문(창동리 한담모퉁이)이 큰 야산으로 인해 가로막혀 관광도시로서 기능을 떨어뜨리고 있는바,
  - 봉평면 시가지가 한눈에 보일 수 있도록 야산을 제거할 수 있는 방안을 검토하기 바람

### □ 처리계획

- 2003년도에 국도 우회도로 개설시 봉평시가지 진입부 급커브 선형으로 교통사고 위험이 매우 높아 선형개량 건의하였으며, (건의카드작성 제출: 원주지방국토관리청2회, 2004년도, 2005년도)
- 도로선형 개량이 시급히 이루어지지 않을시 봉평시가지 진입로 안내표지판을 설치하여 줄 것을 요청토록 할 계획임.
